福祉環境委員会

令和3年5月10日(月) 10時00分~ 時 分 全 員 協 議 会 室

【委員】柳楽委員長、村武副委員長 沖田委員、小川委員、岡本委員、佐々木委員、田畑委員、澁谷委員

【議 長・委員外議員】

【福祉環境委員会 所管管理職】

砂川副市長

[上下水道部]有福上下水道部長、白根管理課長、谷口工務課長

[金城支所]篠原金城支所長

〔総務部〕坂田総務部長

【事務局】中谷書記

議題

1 金城地域断水防止対策について

2 その他

金城地域断水防止対策について

令和3年1月7日からの寒波による水道施設への凍結・漏水により、給水制限を 行いました。その結果、断水が発生し、市民の皆さまの生活に大きな影響を及ぼし ました。今後、同様の断水を発生させないため、水道事業にかかわっている各種企 業の協力を得ながら、下記のとおり断水防止対策を行います。

記

1 断水の原因

水道管が凍結破損し漏水が発生。その結果、配水タンクの水位が低下し、給水 制限を実施したことから断水となった。

(1)水道管(給水装置含む)の凍結破損による漏水の発生

1月10日から気温の上昇に伴い凍結箇所からの漏水が始まり、配水タンクからの配水量が増加した。金城地域では、10日の夕方にピークを迎えた。

施設別漏水箇所(金城地域)

- ①配水管(浜田市管理部分)漏水 2件
- ②給水管(個人管理部分)漏水 325件

(2)配水タンクの水位低下

漏水発生の結果、1月11日14時の時点で、今福中央配水タンク(貯水量500トン)では20トン/時間程度、下ノ原配水タンク(貯水量416トン)では30トン/時間程度、配水量が流入量を上回り、このままでは配水タンクの水位が0になることが想定された。このため、11日14時から12日11時まで配水量を通常時の60%削減する給水制限を実施した。その結果、配水池から離れた地域や標高が高い地域を中心に15日まで断水が発生した。

2 断水防止対策

断水防止対策を講じるためには、実態把握を行い、原因分析を行ったうえで、対策を行う必要がある。しかし、実態把握、原因分析には時間がかかり、次の冬までに対応が間に合わない可能性がある。コンサルと協議の結果、タンクを増設すれば、かなりの確度で断水は防げるとのことであり、先ずはタンクの増設を行う。

- (1) 今福地区タンク増設および雲城地区配水流量確保(令和3年補正予算対応予定)
- ① 今福・久佐地区の漏水調査時間を確保するために、今福中央配水池の既存の PC (コンクリート製) タンク (500 トン) に加え、敷地内に同規模のタンクを増設する。タンク容量は、給水制限を開始した 1 月 11 日 14 時の配水量 54.4 トン/時間(以下「/時間」省略)と流入量 35.3 トンの差である 19.1 トンを 24時間カバーできる量として、500 トンと設定した。また、既存タンクと増設タンクは、連絡管で繋げる構造とし2つのタンクを連動させて運転する。

タンクの設置位置は、新たな用地取得やポンプ設備も不要で、配水管の設置 も最小限となり、また、既存タンクの改修時にも有効に利用できることから、 現在の敷地とした。

② 雲城地区には、下ノ原配水池(416 トン)とその上流に上来原配水池(第1、第2、合計750 トン)がある。1月の寒波の際の稼働実績は、下ノ原配水池の最大配水量73.1トン/時間(以下「/時間」省略)に対し、流入量は44.0トンであり、29.1トン不足していた。この不足を解消するためには、上来原配水池の配水量を現状の67.6トンに29.1トンを加えた、96.7トンにする必要がある。コンサルタント会社に上来原配水池からの配水管路の設備状況(減圧弁、制水弁)の確認と、配水流量計算を依頼した結果、最大配水量130.0トンが可能であり、減圧弁と制水弁の開閉度や圧力を調整し対応する。

また、青原地区、水上谷地区などの出水不良についても、調査し必要な対策を講じる。

- (2) 実態把握をふまえた対策(令和2年度予算繰越対応)
- ①今後の運転管理、更新計画の資料とするため、断水の実態を把握する。
- ②事前に金城町の行政連絡員会議(4月21日)、地域協議会(4月22日)において調査協力を依頼した。
- ③金城地域全域、後野町・長見町・内村町の一部(計 2,029 戸)に調査票を配布 し、凍結防止策や断水の有無について調査する。(別紙 1 参照(コンサルタント 会社と協議し作成)、4月30日発送済)
- ④調査票を5月中に回収し、6月中に集計、実態を把握する。
- ⑤上記(1)の対策は、今年度冬季に断水を起こさないための対策であり、実態把握の結果に基づき、運転管理の見直しや更なる施設整備を検討する。
- ⑥大口利用者に使用水量を抑制するよう協力をお願いする。

- (3) 止水栓台帳の整備 (令和3年度既定予算対応)
- ①積雪時でも、止水栓および量水器(水道メーター)の位置を容易に見つけ出し、 止水して漏水防止ができるように、各給水施設の止水栓台帳を整備する。
- ②凍結・漏水が発生した場合、市職員で編成した止水班が、この止水栓台帳を基に漏水家屋を止水し断水を回避する。
- ③1月の寒波では、配水池水位低下確認から約12時間で給水制限に至り、漏水を 止水する猶予がなかった。そこで、前述の対策を講じることにより、さらに24 時間程度の作業時間を確保し、この間、止水班による漏水のための止水を実施 する。


3 体制及び情報提供、住民説明

- (1) 凍結災害対応体制の整備 市全体として、凍結被害に対応できるようマニュアルを見直す。
- (2)支所との連携 体制整備において、上下水道部と支所の役割分担について見直す。
- (3)情報発信 これまでの情報発信を検証し、タイミング、頻度、内容を見直す。
- (4)地域住民への説明

各地区または、集落単位などで、今後の市の行う対策や個人でできる凍結漏水 防止策についての説明会を実施する。

4 全体スケジュール

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 月	11月	12 月	1月
実態把握		調査コンサバ	> レタント	業務							
止水栓台帳		計画	i >		調査・	作成					
施設増強 (今福地区)		調査・清	計画〉		今	福地区	タンク	'增設工	事		供用
(雲城地区)		調	堂・計画	雲城	地区 i	或圧弁等	・調整	・追加ス	対策		

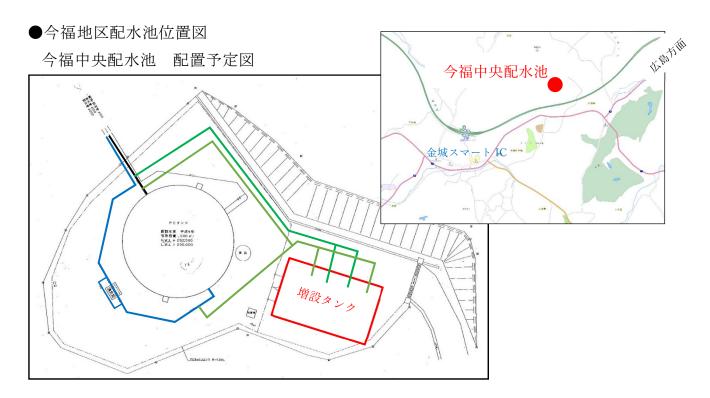


現況写真

イメージ写真(後野減圧水槽126トン)





●雲城地区配水池位置図

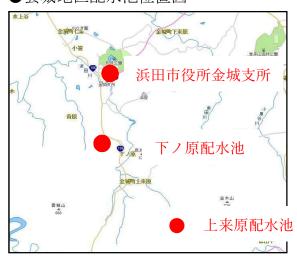

別紙 1

凍結被害状況実態調査 【回答用紙】

該当 いしま)他」を選択した場合は()内に記入をお願	į
問1.	1月7日からの寒波の際に、あなたの: を少しずつ流していましたか?	お宅では凍結防止対策として、蛇口から	水
	(1) 流していた	(2) 流さなかった	
問2.	令和3年1月7日(木)からの寒波の際に 凍結防止対策をお答えください。(こ、あなたのお宅の給水設備で実施された 複数回答可)	ځ
	(1) 蛇口を布等でまく	(2) 給水管や給湯器の水抜き	
	(3) 凍結防止ヒーターの活用	(4) その他 ()	
	(5) 特に何もしなかった		
問3.	令和3年1月7日(木)からの寒波の際に し、水が出なくなりましたか?	こ、あなたのお宅で水道管や給湯器が凍紅	吉
	(1) 凍結し水が出なくなった	(2) 凍結しなかった	
問4.	令和3年1月7日(木)からの寒波の際に 生しましたか?	こ、あなたのお宅では漏水(水もれ)が発	浴
	(1) 漏水が発生した	(2) 漏水しなかった	
間5.	令和3年1月11日(月・祝)からの給水制	限で、あなたのお宅では断水しました	

問6. 今回の寒波に対して上下水道部に対するご意見等がありましたらご記入ください。

(1) 断水した → その期間は () 日間だった

か?

ターへ提出してください。


(2) 断水しなかった

(3) 凍結していてわからなかった

ご協力いただきありがとうございました。 同封の返信用封筒(切手不要)で返送していただくか、金城支所、または各地区まちづくりセン

断水防止対策検討フロー

別紙 2

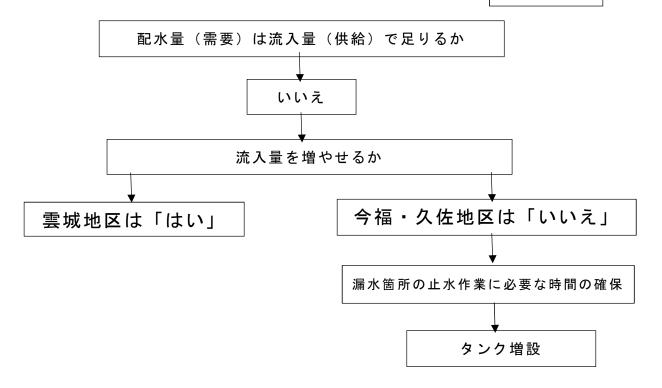

今福・久佐地区【今福中央配水池の水位低下】

- ① ピーク時は、流入量 35.3 トンに対し配水量 54.4 トンを計測 1 時間当たり 19.1 トンの不足(水位が約 17 cm低下する)
- ② 実績最大流入量は、36.7トンである
- ③ 1月に21時間の給水制限によるタンク水位の回復と、給水制限中の漏水止水作業により通常運転に戻せたことを参考に24時間の作業時間を確保する
- ④ 1 時間当たり 20.0 トンとして 24 時間で計算すると 480 トンとなり、容量を 500 トンとした

雲城地区【下ノ原配水池の水位低下・上来原配水池の水位満水】

- ① ピーク時は、流入量 44.0 トン/時間(以下「/時間」省略)に対し配水量 73.1 トンを計測
 - 1 時間当たり 29.1 トンの不足(水位が約 40 cm低下する)
- ② 配水量に見合う流入量の確保が条件
- ③ 上来原配水池~下ノ原配水池の配水管に減圧弁および制水弁が設置してあり、それぞれの弁の、開閉度や圧力を調整して必要量を配水する

調整手順

- ① 設置機器の仕様、設置条件による最大流量 130 トン (確認済み)
- ② 計算結果に基づく現地での確認を行う
- ③ 現地での確認により、再調整を行う

別紙3


上水道金城地域断水防止対策


	上水道金城地域断水防止対策														
			令和2年度												3
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
1	実態把握および検討														
(1)	実態調査(金城地区、後野町、長見町、内村町の一部)	2,029件				→									
1	調査票送付			=)										
2	調査票回収														
3	※ 追加調査					→									
(2)	コンサル業務							\Rightarrow							
1	実態把握	3,630,000円													
	調査票集計	3/19-6/30				\rightarrow									
2	現状解析														
	配水能力確認							\Rightarrow							
2	施設増強対策														
	雲城地区														
(1)	調査・計画・調整														
1	データ確認					•									
2	水理計算														
3	現地実証確認			•	\rightarrow										
4	設備(減圧弁、制水弁)調整														
	今福地区														
(1)	調査・計画				\Rightarrow										
1	データ確認		\longrightarrow												
2	設計・地盤調査				\Rightarrow										
(2)	施設増強工事											\rightarrow			
1	増設タンク設置工事										\rightarrow				
2	既設配水タンク改造工事											\longrightarrow			
3	水質試験および使用開始前届提出(保健所)														
4	供用開始														
										<u> </u>					
	53.1-70 0		浜田市σ)作業	•			コンサノ	レ作業	•			丁事施-	г	•

浜田市の作業

コンサル作業

工事施工

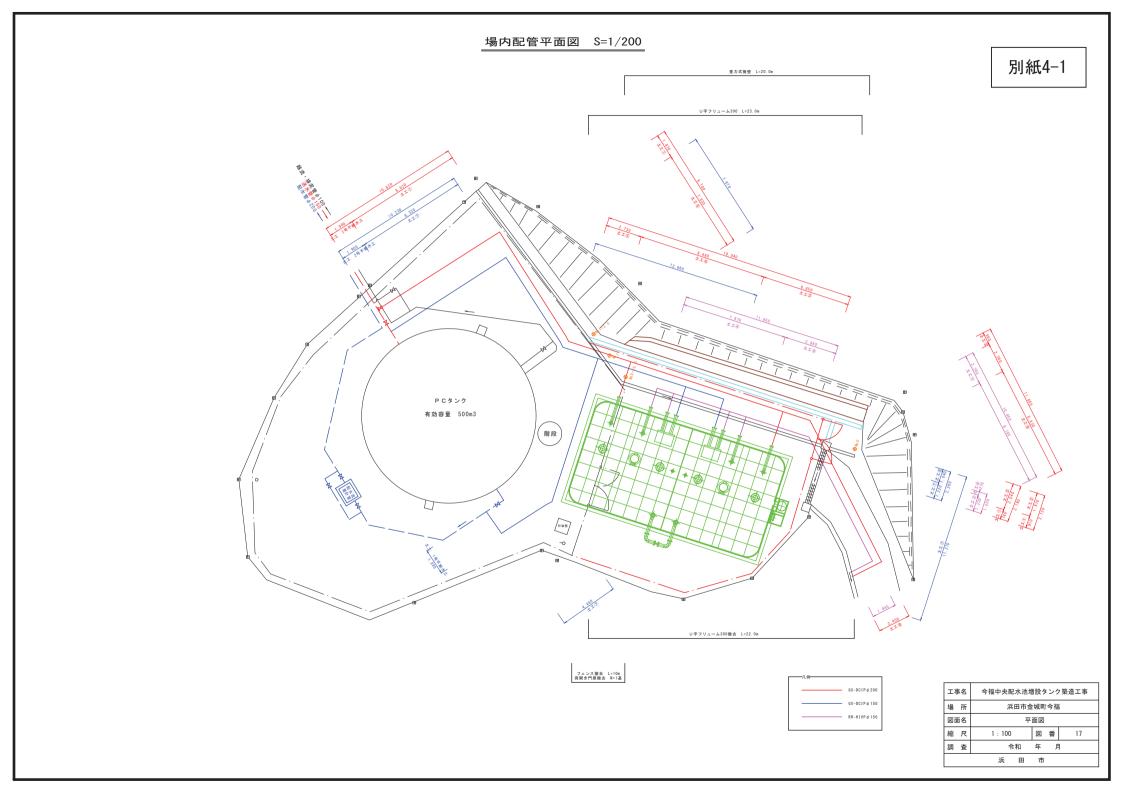


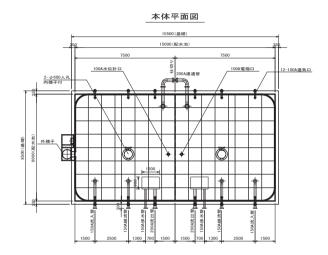


ス	テン	ノレス鋼材	反製配	水池仕	鎌				
有效	容量	500m3 2池式							
本体	寸法	8000 × 15000	× 5000H						
本体	材質	天井板	t1.5	SUS					
		側板5段目	t1.5	SUS					
		侧板4段目	t2.0	SUS					
		側板3段目	t2.0	SUS					
		側板2段目	t2.5	SUS					
		側板1段目	t2.5	SUS					
		仕切板5段目	t1.5	SUS					
		仕切板4段目	t2.0	SUS					
		仕切板3段目	t2.0	SUS					
		仕切板2段目	t3.0	SUS					
		仕切板1段目	t3.0	SUS					
		應板	t3.0	SUS					
		底板(アニュラ)	t6.0	SUS					
受	台	C-100 × 50 × 6		SUS					
質	量	受台 480kg							
		本体 16,520kg							
特	58	本体溶接構造							
		内部構造はフレ	ーム&バネ	ル構造					
		池底はフラット	構造						
		2mH補強レス構造							

選入等 SUS 150A 提出管 SUS 200A 類点管 SUS 150A 導流管 SUS 150A 通過管 SUS 200A 名 称 47 双 7 法 備 考 人 孔 SUS 200A (P科子 SUS 100A P科子 SUS 300 × 300 P科子 SUS 100A F 間 SUS 100A できた 505 100H できた 505 100H できた 505 100A	34 59	177 344	., ,,,,,	Net -27
超武管 535 150A 150A 150A 150A 150A 150A 150A 150	流入管	SUS	150A	
博木管 SUS 150A 連通管 SUS 200A 名 称	流出管	SUS	200A	
通通管 SUS 200A 名 符 対 質 寸 法 備 考 人 孔 SUS 46600 過数に SUS 100A P科科子 SUS 330×300 F科科子 SUS 330×300 F 間 SUS 1100H ひさし SUS 1150 ひさし SUS 1150	越流管	SUS	150A	
名 将 質 寸法 億 考 人 孔 SUS 6000 通気口 SUS 100A PNA子 SUS 330×300 外格子 SUS 400×300 年 間 SUS 1100H ひさし SUS 前50	排水管	SUS	150A	
사 취 SUS 6000 제품 CD SUS 100A 위해구 SUS 230 × 200 위해구 SUS 230 × 200 위해구 SUS 1100H D-R USUS 1100H D-R USUS 1150H	連通管	SUS	200A	
사 취 SUS 6000 제품 CD SUS 100A 위해구 SUS 230 × 200 위해구 SUS 230 × 200 위해구 SUS 1100H D-R USUS 1100H D-R USUS 1150H				
通気口 SUS 100A 内容子 SUS 330×300 外格子 SUS 400×300 手 撰 SUS 1100H ひさし SUS W150 水位計口 SUS 1100A	名 称	材質	寸 法	備考
内緒子 SUS 330×300 分4巻子 SUS 400×300 子 摺 SUS 1100H U さし SUS W150 水位計口 SUS 100A	人孔	SUS	φ 600	
外様子 SUS 400×300 手 贈 SUS 1100H ひさし SUS W150 水位計口 SUS 100A	通気口	SUS	100A	
手 摺 SUS 1100H ひさし SUS W150 水位計口 SUS 100A	内排子	SUS	330 × 300	
ひさし SUS W150 水位計口 SUS 100A	外排子	SUS	400 × 300	
水位計口 SUS 100A	手 摺	SUS	1100H	
	ひさし	SUS	W150	
電極口 SUS 100A	水位計口	SUS	100A	
	電極口	SUS	100A	

本体立面図



本体側面図



ΙĄ	名	今福中央	築造工事							
場	所		浜田市:	金城町	总城町今福					
図面	百名	i	配水池	一般	一般構造図					
縮	尺	1 : 20	00	図	番	1				
調	査		令和	年	F	1				
		浜	田	市						
