資料５

ケーブルテレビ光化工事の進捗について

【住民説明会】

・R4.１月から順次開催。自治会・集落は８月 21 日で説明会完了。

・7/13 企業等（81 件）説明会開催。

・7/26 加入休止者（権利所有者）321 件への案内を実施。回答 100 件（内 84 件脱退、16 件光化）

・９月から集合住宅関係の説明会を開始。

・契約移行手続き　2,104/2,390 件（10/10 現在）

【宅内工事】

６月末から順次着工　10/17 現在で 720/2,390 件切替完了。

進捗状況

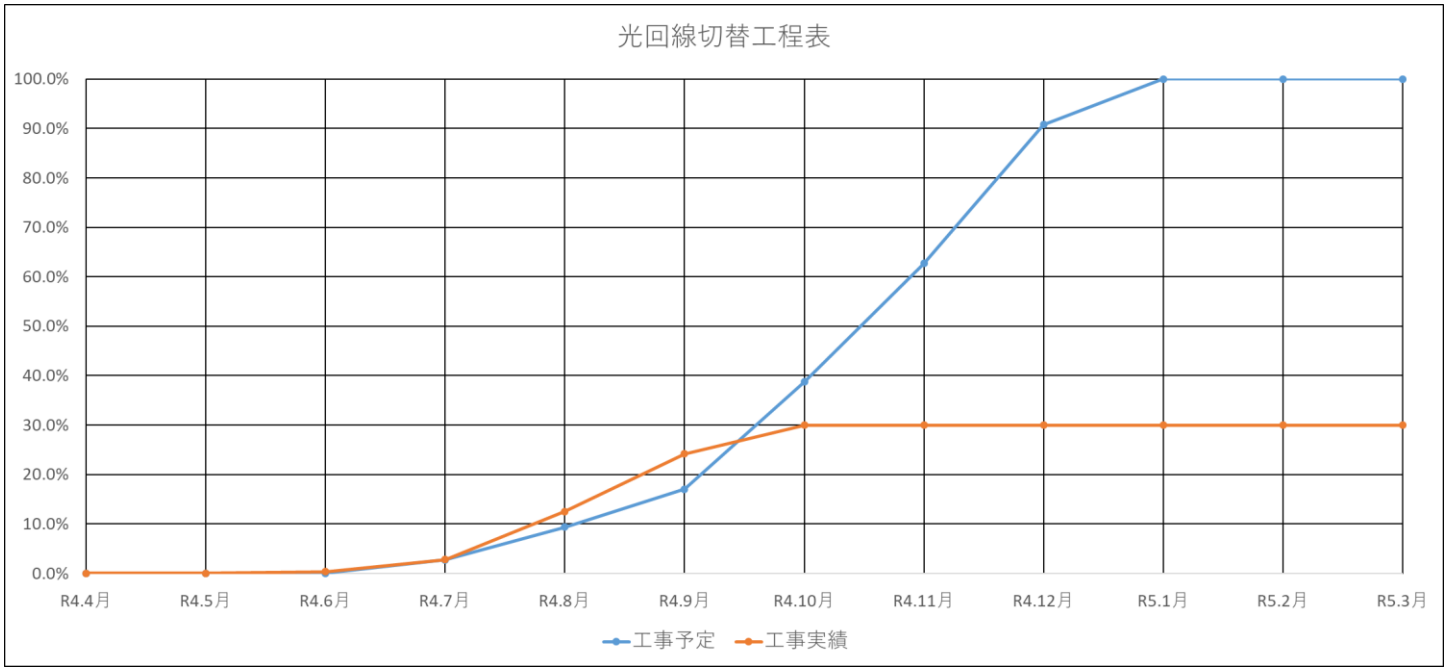

【工事予定表】

工種	単位	設計数量	施工数量	工種別進捗率	全工程進捗率	R4.4月	R4.5月	R4.6月	R4.7月	R4.8月	R4.9月	R4.10月	R4.11月	R4.12月	R5.1月	R5.2月	R5.3月
引込（放送）	件	1,400	1,400	100.0%	58.3%	0	0	0	44	90	115	313	345	405	88	0	0
引込（放送+ネット）	件	1,000	1,000	100.0%	41.7%	0	0	0	22	69	69	207	230	270	133	0	0
計	件	2,400	2,400	100.0%	100.0%	0	0	0	66	159	184	520	575	675	221	0	0
累計	件					0	0	0	66	225	409	929	1,504	2,179	2,400	2,400	2,400

【工事実績表】

工種	単位	設計数量	施工数量	工種別進捗率	全工程進捗率	R4.4月	R4.5月	R4.6月	R4.7月	R4.8月	R4.9月	R4.10月	R4.11月	R4.12月	R5.1月	R5.2月	R5.3月
引込（放送）	件	1,400	445	31.8%	18.5%	0	0	8	38	140	170	89					
引込（放送+ネット）	件	1,000	275	27.5%	11.5%	0	0	1	20	93	110	51					
計	件	2,400	720	30.0%	30.0%	0	0	9	58	233	280	140	0	0	0	0	0
累計	件					0	0	9	67	300	580	720	720	720	720	720	720

工事進捗率	R4.4月	R4.5月	R4.6月	R4.7月	R4.8月	R4.9月	R4.10月	R4.11月	R4.12月	R5.1月	R5.2月	R5.3月
工事予定	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	9.4%	17.0%	38.7%	62.7%	90.8%	100.0%	100.0%	100.0%
工事実績	0.0%	0.0%	0.4%	2.8%	12.5%	24.2%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%
