

全 員 協 議 会

令和3年11月15日（月）
午前10時～
議場

〔出席議員〕

笹田議長、川神副議長
肥後議員、村木議員、大谷議員、三浦議員、沖田議員、足立議員、村武議員、
川上議員、柳楽議員、串崎議員、小川議員、上野議員、布施議員、岡本議員、
芦谷議員、永見議員、佐々木議員、田畑議員、西田議員、牛尾議員

〔執行部〕

市 長、副市長、教育長、
総務部長、健康福祉部長（教育部参事）、健康福祉部参事、都市建設部長、
上下水道部長、市長公室長

説明員（執行部報告事項(1)）JR西日本米子支社 山陰地域振興本部担当課長

〔事務局〕

局長、次長、浜野書記

議 題

1 執行部報告事項

- (1) 浜田駅周辺整備事業に伴うJR委託工事費及び今後のスケジュール（都市建設部）
ルについて
- (2) 新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第10弾】（市長公室）
（案）について
- (3) 新型コロナウイルス感染症関連の状況について（健康福祉部）
- (4) 新型コロナウイルスワクチンの接種状況について（健康福祉部）
- (5) 「休日応急診療所」及び「病後児保育室」の移転に伴う市役所（健康福祉部）
での開設終了について
- (6) 周布橋仮設歩道橋整備事業の進捗について（都市建設部）
- (7) 第2回 金城地域断水防止対策住民説明会について（上下水道部）
- (8) その他

2 その他

令和 3 年 11 月 15 日
全 員 協 議 会 資 料
都市建設部 建設整備課

浜田駅周辺整備事業に伴う JR 委託工事費 及び、今後のスケジュールについて

【施工場所】


浜田市田町地内（エディオン浜田店周辺～県道浜田停車場線）

【事業概要】

事業期間：平成 27 年度～令和 5 年度

事業内容：君市踏切の移設拡幅

市道の 2 車線化及び歩道整備

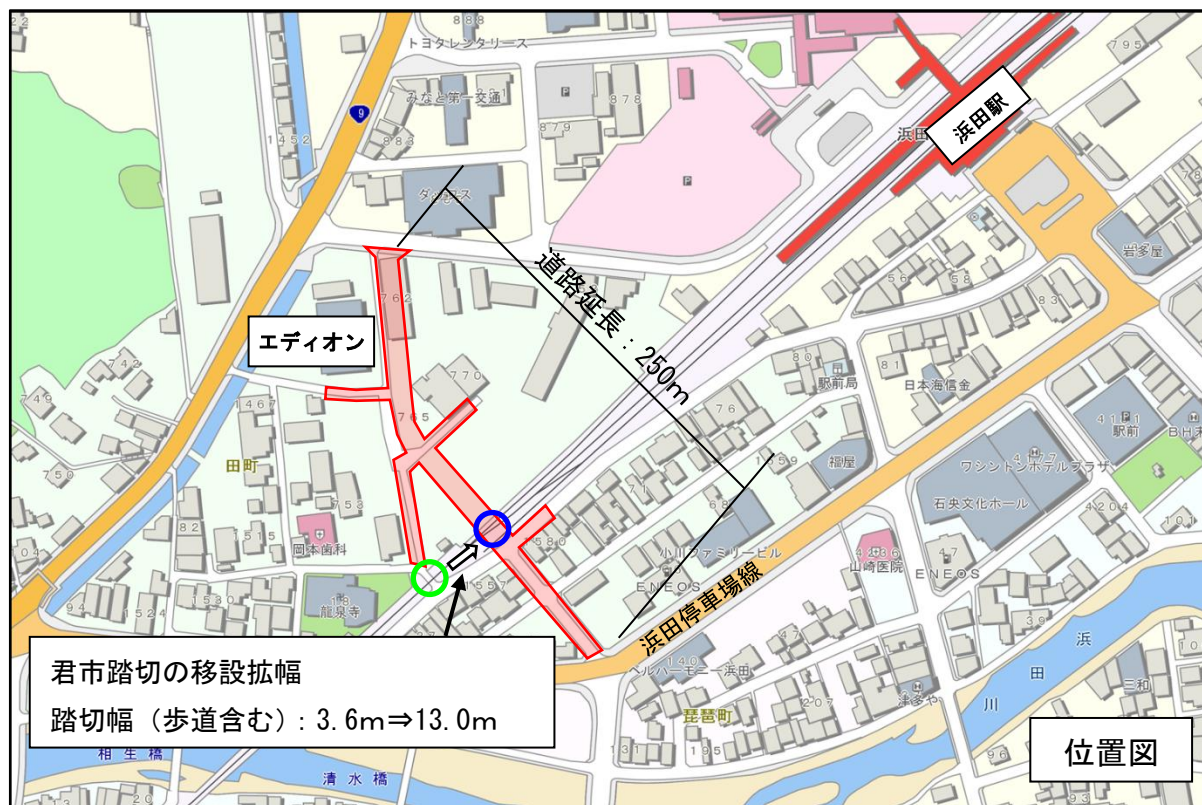

1 JR 委託工事に係る事業費の増額について

JR への委託工事費について、詳細設計の結果、271 百万円から 342 百万円増額となり、総額 613 百万円が見込まれることとなりましたので、詳細をご報告します。

委託工事費 工種別内訳表	(単位：百万円)		
工 種	当 初	今 回	差 額
①駅構内改良工事	163	416	253
②踏切移設拡幅工事	108	114	6
③道路擁壁等整備	-	38	38
④管理費	-	45	45
委託工事費合計	271	613	342

【主な増額理由】

① 駅構内改良工事

- ・踏切移設に起因する分岐器の移設による軌道影響範囲が、詳細設計及び施工計画の精査の結果、当初の想定より規模が拡大した。
- ・詳細設計の結果、電気設備（信号機、ケーブル等）の数量の増加。
- ・線路設備変更に伴う電気システムの改修等を見込めていなかった。

② 踏切移設拡幅工事

- ・詳細設計の結果、電気設備（ケーブル等）の数量が増加。

③ 道路擁壁等整備

- ・道路擁壁の整備等について鉄道に近接する工事となるため、市から JR への委託工事の追加。

④ 管理費

- ・当初、JR 委託工事に伴う管理費が未計上であった。

【増額に伴う市実質負担額】

国費及び地方債の交付税分を除いた金額 49 百万円が実質負担額として増額となる。


委託工事費 財源内訳表	(単位：百万円)		
財源種別	当 初	今 回	差 額
社会資本整備総合交付金（国費）	155	351	196
合併特例債（地方債）	77	174	97
一般財源	39	88	49
合 計	271	613	342

2 君市踏切の供用開始時期について

○供用開始時期：令和5年12月末

工事内容	令和 4 年度				令和 5 年度			
	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3
駅構内改良工事						踏切供用開始		
踏切移設拡幅工事					★			
道路擁壁等整備								
旧踏切撤去								

※5/20頃～9/20頃：酷暑期（線路工事が規制される期間）

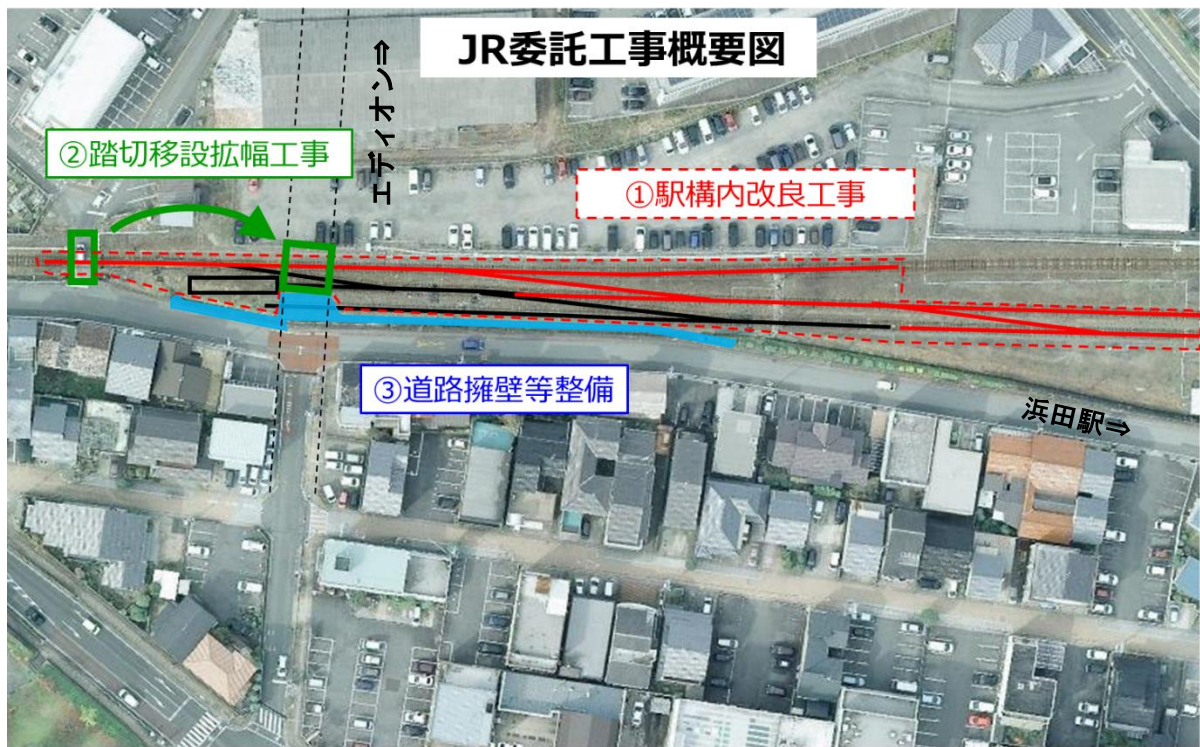

3 今後のスケジュールについて

●令和3年12月議会

工事期間が令和4年度～5年度の複数年となるため、債務負担行為による予算提案。

●令和4年3月議会

JR委託工事の基本協定について、議決に付すべき契約となるため議会提案。

新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第 10 弾】（案）について

このたび、新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第 10 弾】（案）を取りまとめました。

支援策【第 10 弾】は、全て市独自事業で 7 事業、5,003 万円。財源は、財政調整基金などを活用します。

今回の支援策【第 10 弾】によって、市独自支援策の総事業費は、第 1 弾～第 9 弾と合わせて、合計 47 億 9,879 万円（既存予算対応分を除く）となります。

一部事業を除き、12 月市議会定例会議に諮り、議決を得た上で、出来るものから順次、実施する予定です。

令和 3 年 11 月 15 日

浜田市長 久保田 章市

1 市の独自支援策

○事業費 5,003 万円（財源内訳 財政調整基金 4,982 万円、その他既存予算対応 21 万円）

区分	No	事業内容等	事業費	担当課
1 個人向け	1-1	生活困窮者への年末年始支援事業 長引く感染症の影響を受けて生活困窮に陥り、社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の全ての特例貸付を利用した世帯に対し、浜田市共通商品券や食品等を配付。	21 万円 (既存予算対応)	地域福祉課
2 事業者向け	2-1	感染症対策飲食店応援給付金 感染防止対策促進と飲食店支援とのため、「島根県新型コロナ対策認証店」に認証された市内飲食店に対し給付金（1 店舗当たり定額 20 万円）を支給。 ※ 申請期間 令和 3 年 12 月 20 日～令和 4 年 3 月 18 日（予定） ※ 認証に向けたアドバイスや手続き支援など、一部事務を浜田市観光協会が実施。	2,000 万円	観光交流課
	2-2	観光関連事業者応援給付金 令和 2 年 12 月から令和 3 年 12 月までの間で連続する 2 か月の売上高の合計が、対前年又は、前々年同期間と比較して 50%以上減少している観光関連事業者（宿泊施設、旅行業者、観光バス事業者、タクシー事業者、イベント企画運営事業者、神楽産業事業者）に対して給付金（1 事業者当たり定額 40 万円）を支給。	2,000 万円	観光交流課

	2-3	市源泉使用温泉施設支援 市が源泉を供給する美又、湯屋、旭の温泉施設の温泉供給料金等 6 か月分（令和 3 年 10 月～令和 4 年 3 月分）を免除。 ※ 支援策第 1 弾に続き、2 回目の実施	200 万円 (歳入の減額)	観光交流課
3 その他	3-1	高齢者福祉施設等への抗原検査キット購入補助事業 高齢者福祉施設等（高齢者福祉施設、障がい者支援施設、保育所等）における、感染症の早期発見や感染拡大防止を図るため、各施設が購入する抗原検査キットの費用を助成。 ※ 対象期間 令和 3 年 12 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日購入分	213 万円	地域福祉課 健康医療対策課 子育て支援課
	3-2	成人式における感染対策事業 成人式の出席者に対し、抗原検査キットを配布。	167 万円	まちづくり社会教育課
	3-3	市有施設等パーテーション購入 市有施設（まちづくりセンター、文化施設、スポーツ施設等）の会議室等で使用する飛沫防止用パーテーションを購入。	602 万円	まちづくり社会教育課、教育総務課、文化スポーツ課

No. 1-1、3-1 を除き、12 月議会補正予算の当初提案により対応（No. 1-1 は既存予算対応、No. 3-1 は今後補正予算対応）

新型コロナウイルス感染症関連の状況について

1 新型コロナウイルス感染症患者の状況

全国的に感染者は減少していますが、浜田市では、10 月に 2 か所の高齢者福祉施設においてクラスターが発生したほか、多数の感染者が確認されました。ワクチン接種を 2 回された方の感染も確認されていますので、改めて一層の感染対策をお願いします。

◇患者件数（月）（人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和 2 年度						2			4	4			10
令和 3 年度	7	13		2	97	56	50						225

※令和 3 年 11 月 10 日公表分まで

2 新型コロナウイルス感染症電話相談の状況

令和 2 年 4 月に島根県内に患者が確認されたことから、県の要請により健康医療対策課・支所市民福祉課において電話相談を実施しています。また、令和 3 年 3 月からは、ワクチンに関する相談も県報告に計上することになりましたので、浜田市新型コロナウイルスワクチンコールセンターの相談も計上しています。

◇相談者数及び相談件数（年度）（件）

	相談者数(人)	症状等の健康相談	医療体制	予防・治療	ワクチン副反応	ワクチン一般	その他
令和 2 年度	273	49	21	10	0	19	178
令和 3 年度	4,649	33	9	11	13	4,121	471

◇相談者数及び相談件数（月）

令和 3 年度	相談者数(人)	症状等の健康相談	医療体制	予防・治療	ワクチン副反応	ワクチン一般	その他
4 月～9 月まで	4,266	32	9	9	12	3,754	459
10 月	343	1	0	0	0	333	9
11 月	40	0	0	2	1	34	3

※令和 3 年 11 月 9 日現在

（注）相談者の複数相談もあり、相談者数と相談内容の合計は一致しません。

3 浜田市外来検査センターの状況

島根県の委託を受けて、浜田市内の医療機関から紹介を受けた患者を対象に新型コロナウイルス感染症の検体検査を行っています。検体採取に係る運用マニュアルを遵守し安全な業務の遂行に努めます。（令和 4 年 3 月 31 日まで期間延長）

◇検査件数（月）（件）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和 2 年度									1	14	4	1	20
令和 3 年度	9	4	6	5	13	17(2)※	4	7					65(2)

※令和 3 年 11 月 9 日現在

（ ）は陽性件数

新型コロナウイルスワクチンの接種状況について

1 接種状況について

(1) 対象者(12 歳以上)の地域別接種実績

(単位：件)

区分	計	浜田	金城	旭	弥栄	三隅
券送付数	47,492	34,995	3,698	2,388	1,109	5,302
1 回目	42,773	31,338	3,393	2,183	1,006	4,853
	90.1%	89.5%	91.8%	91.4%	90.7%	91.5%
2 回目	41,261	30,171	3,306	2,100	992	4,692
	86.9%	86.2%	89.4%	87.9%	89.4%	88.5%

(2) 対象者(12 歳以上)の年代別接種実績

(単位：件)

区分	12 歳～ 19 歳	20 歳～ 29 歳	30 歳～ 39 歳	40 歳～ 49 歳	50 歳～ 59 歳	60 歳～ 64 歳	65 歳～
券送付数	3,265	4,013	4,501	6,232	6,054	3,463	19,964
1 回目	2,686	3,224	3,726	5,504	5,538	3,222	18,873
	82.3%	80.3%	82.8%	88.3%	91.5%	93.0%	94.5%
2 回目	2,305	2,884	3,378	5,208	5,483	3,209	18,794
	70.6%	71.9%	75.0%	83.6%	90.6%	92.7%	94.1%

※ 令和 3 年 11 月 9 日時点の VRS での状況

※ 「券送付数」は、接種券を発行した総数から、2 回接種を受けていない死亡者及び転出者を除いた数

(3) 住所地外での接種状況

ア 浜田市に住所があるが、他自治体で接種した件数 2,155 件

イ 他自治体に住所があるが、浜田市で接種した件数 3,265 件

※ 内閣官房 IT 総合戦略室作成資料「ワクチン接種状況_令和 3 年 11 月 8 日」による 4/12～11/2 の間の VRS 実績（11/3 出力分、ただしファイザー使用分のみ、先行接種者及び職域接種者を除く）。

2 今後の1回目及び2回目の接種対応について

今後は、接種希望者が大幅に少なくなるため、予約申込先や実施医療機関等を変更する。

(1) 予約申込先

- ・浜田市新型コロナウイルスワクチンコールセンターに電話申込
- ・受付開始日 令和3年11月1日から令和4年2月末（予定）

(2) 実施医療機関等

- ・市内8医療機関
- ・接種期間 令和3年11月15日から令和4年2月末（予定）

(3) その他

- ・別添「浜田市新型コロナウイルスワクチン11月以降の予約・接種先のご案内」を広報はまだ11月号に折込み、周知を図る。

3 3回目の接種対応について

(1) 概要（見込み）

ア 実施時期

- ・12月開始予定。

イ 対象者

- ・2回目接種から概ね8か月経過した者。

ウ 使用するワクチン

- ・国により検討中（1・2回目に用いたワクチンと同一のワクチンを用いることを基本としつつ、更なる科学的知見等を踏まえ、早急に結論を得る）。

当面実施分は、従前同様ファイザー社製が配分される予定。

(2) 実施スケジュール（見込み）

2回目接種 時期	3回目接種対象 時期(8か月以降)	主な対象者	対象者数
3年3・4月	3年12月～		450人
5月	4年1月～	①	2,150人
6月	2月～	②	7,600人
7月	3月～	③	10,000人
8月	4月～	④	6,800人
9月	5月～		5,400人
10月	6月～		7,000人
11月	7月～		

① 医療従事者 ② 高齢者施設入所者等 ③ 高齢者 ④ その他

浜田市新型コロナウイルスワクチン 11月以降の予約・接種先のご案内

令和3年10月18日 浜田市

新型コロナウイルスワクチンの、1回目または2回目接種を希望される方の予約申込先と、接種を実施する医療機関は次のとおりとなります。(3回目接種ではありません)
すでに11月以降の接種を予約されている方については変更ありません。

【予約申込先】

浜田市新型コロナウイルスワクチンコールセンター

電話 0855-25-9250 開設日時 平日9時～17時（土日、祝日を除く）

【接種を実施する医療機関等】 ※11月15日～来年2月の間

医療機関名	住所	接種実施日時		【予約受付期間】 接種希望日の2週前の週 (11月15日～11月19日の間で 接種を希望する場合は、11月1日 ～11月5日の週が、予約のできる 週となります。) 【予約開始日】 11月1日(月) 予約時にお伝えいただくこと ①接種券番号 ②名前 ③生年月日 ④希望する医療機関・曜日 (第3希望まで) ⑤日中、連絡のとれる連絡先 ⑥これまでの接種回数
さわだクリニック	国分町	金	14:00～15:00	
		土	12:00～12:30	
岡本胃腸科内科医院	長沢町	月	16:00～17:00	
		火	16:00～17:00	
さいとう医院	朝日町	火	15:00～16:00	
彌重内科眼科医院	高田町	水	13:30～17:00	
小池医院	日脚町	月	17:00～17:30	
		金	17:00～17:30	
		土	13:30～14:00	
都医院	治和町	木	9:30～10:00	
		金	9:30～10:00	
酒井外科内科医院	旭町	土	10:00～11:00	
山根病院三隅分院	三隅町	土	10:00～12:00	

【接種日】

接種日時は、申し込まれた翌週にコールセンターから折り返しご案内します。
希望された日程での調整が難しい場合は、ご相談の上ご案内します。

問い合わせ先

浜田市新型コロナウイルスワクチンコールセンター

電話 0855-25-9250 平日9時～17時（土日、祝日を除く）

「休日応急診療所」及び「病後児保育室」の 移転に伴う市役所での開設終了について

休日応急診療所

- ・市役所本庁舎地階での開設

令和 4 年 1 月 3 日（月）まで

- ・移転先（君市踏切北側・田町）での開設

令和 4 年 1 月 9 日（日）から ※予定

* 移転に伴う「浜田市休日応急診療所条例」の一部改正については、12 月定例会議に提案予定です。

病後児保育室

- ・市役所本庁舎地階での開設

令和 3 年 12 月 28 日（火）まで

- ・移転先（君市踏切北側・田町）での開設

令和 4 年 1 月 11 日（火）から ※予定

* 移転後は「病児・病後児保育室」としてオープンする予定です。

運営については、指定管理を予定しており、指定管理者については、12 月定例会議に提案予定です。



11 月 3 日現在現地写真

周布橋仮設歩道橋整備事業の進捗について

1. これまでの経緯と今後の予定

時 期	内 容
令和 3 年 8 月	台風 9 号、8 月豪雨による異常出水のため周布橋が被災し、全面通行止。
10 月	測量設計業務委託契約締結（受注者：株式会社ウエスコ）
10 月～11 月	島根県との河川占用協議
11 月	仮設歩道橋整備工事入札（11 月中旬予定）
令和 4 年 3 月	工事完成（予定）

2. 工事概要

- ✧ 橋長 L=約 100m
- ✧ 歩道幅員 W=3.0m
- ✧ 仮設歩道橋の位置は、周布橋の上流側約 30m の位置に設置する予定です。



3. 歩道幅員の検討

利用者の安全性や利便性、供用期間が長期に及ぶことなどを総合的に勘案して、歩道幅員を 3 メートル に変更します。

【当初】幅員 2m の場合	【変更】幅員 3m の場合
幅員 W=2.0m △ すれ違い時にゆとりが少ない。 ○ 歩道路面と堤防との高低差が小さいため、堤防路面への取付が容易である。	幅員 W=3.0m ◎ すれ違い時にゆとりが多く、通行の安全性が高い。 △ 構造型式の変更が必要となり、施工期間が 20 日間程度長くなる。 △ 歩道路面と堤防との高低差が大きいため、堤防路面への取付工事が必要となる。

4. 周布橋復旧の今後の方針

周布橋復旧については、歩道を確保した新たな橋として架け替えることとし、早期の完成を目標に計画を進めてまいります。

第 2 回 金城地域断水防止対策住民説明会について

金城地域断水防止対策について 9 月議会での説明資料を基に、下記のとおり住民説明会を開催しましたので報告いたします。

記

1 住民説明会開催状況

日程	会場	時間	出席者
9 月 30 日(木)	波佐まちづくりセンター	18 時 30 分～19 時 30 分	14 名
10 月 1 日(金)	小国まちづくりセンター	18 時 30 分～19 時 30 分	10 名
10 月 4 日(月)	今福まちづくりセンター	18 時 30 分～19 時 20 分	18 名
10 月 5 日(火)	雲城まちづくりセンター	18 時 30 分～19 時 20 分	14 名

2 内容

- (1)断水原因の考察と対策
- (2)凍結被害状況実態調査
- (3)今福中央配水池タンク増設工事の進捗状況
- (4)止水栓台帳の整備の進捗状況
- (5)体制および情報提供、住民説明
- (6)全体スケジュール(令和 3 年度)

3 参加者からの主な意見

- ・凍結防止水栓の金額は？

回答 インターネットでは、4,000 円程度。

- ・漏水した場合の水道料金、下水道料金は減免されるのか？

回答 漏水の状況によりますが、減免制度があります。下水道も減免制度があります。

- ・凍結防止水栓に取り換える場合の費用助成の検討をお願いしたい。

回答 要望として持ち帰ります。



〈今福まちづくりセンター〉



〈雲城まちづくりセンター〉
